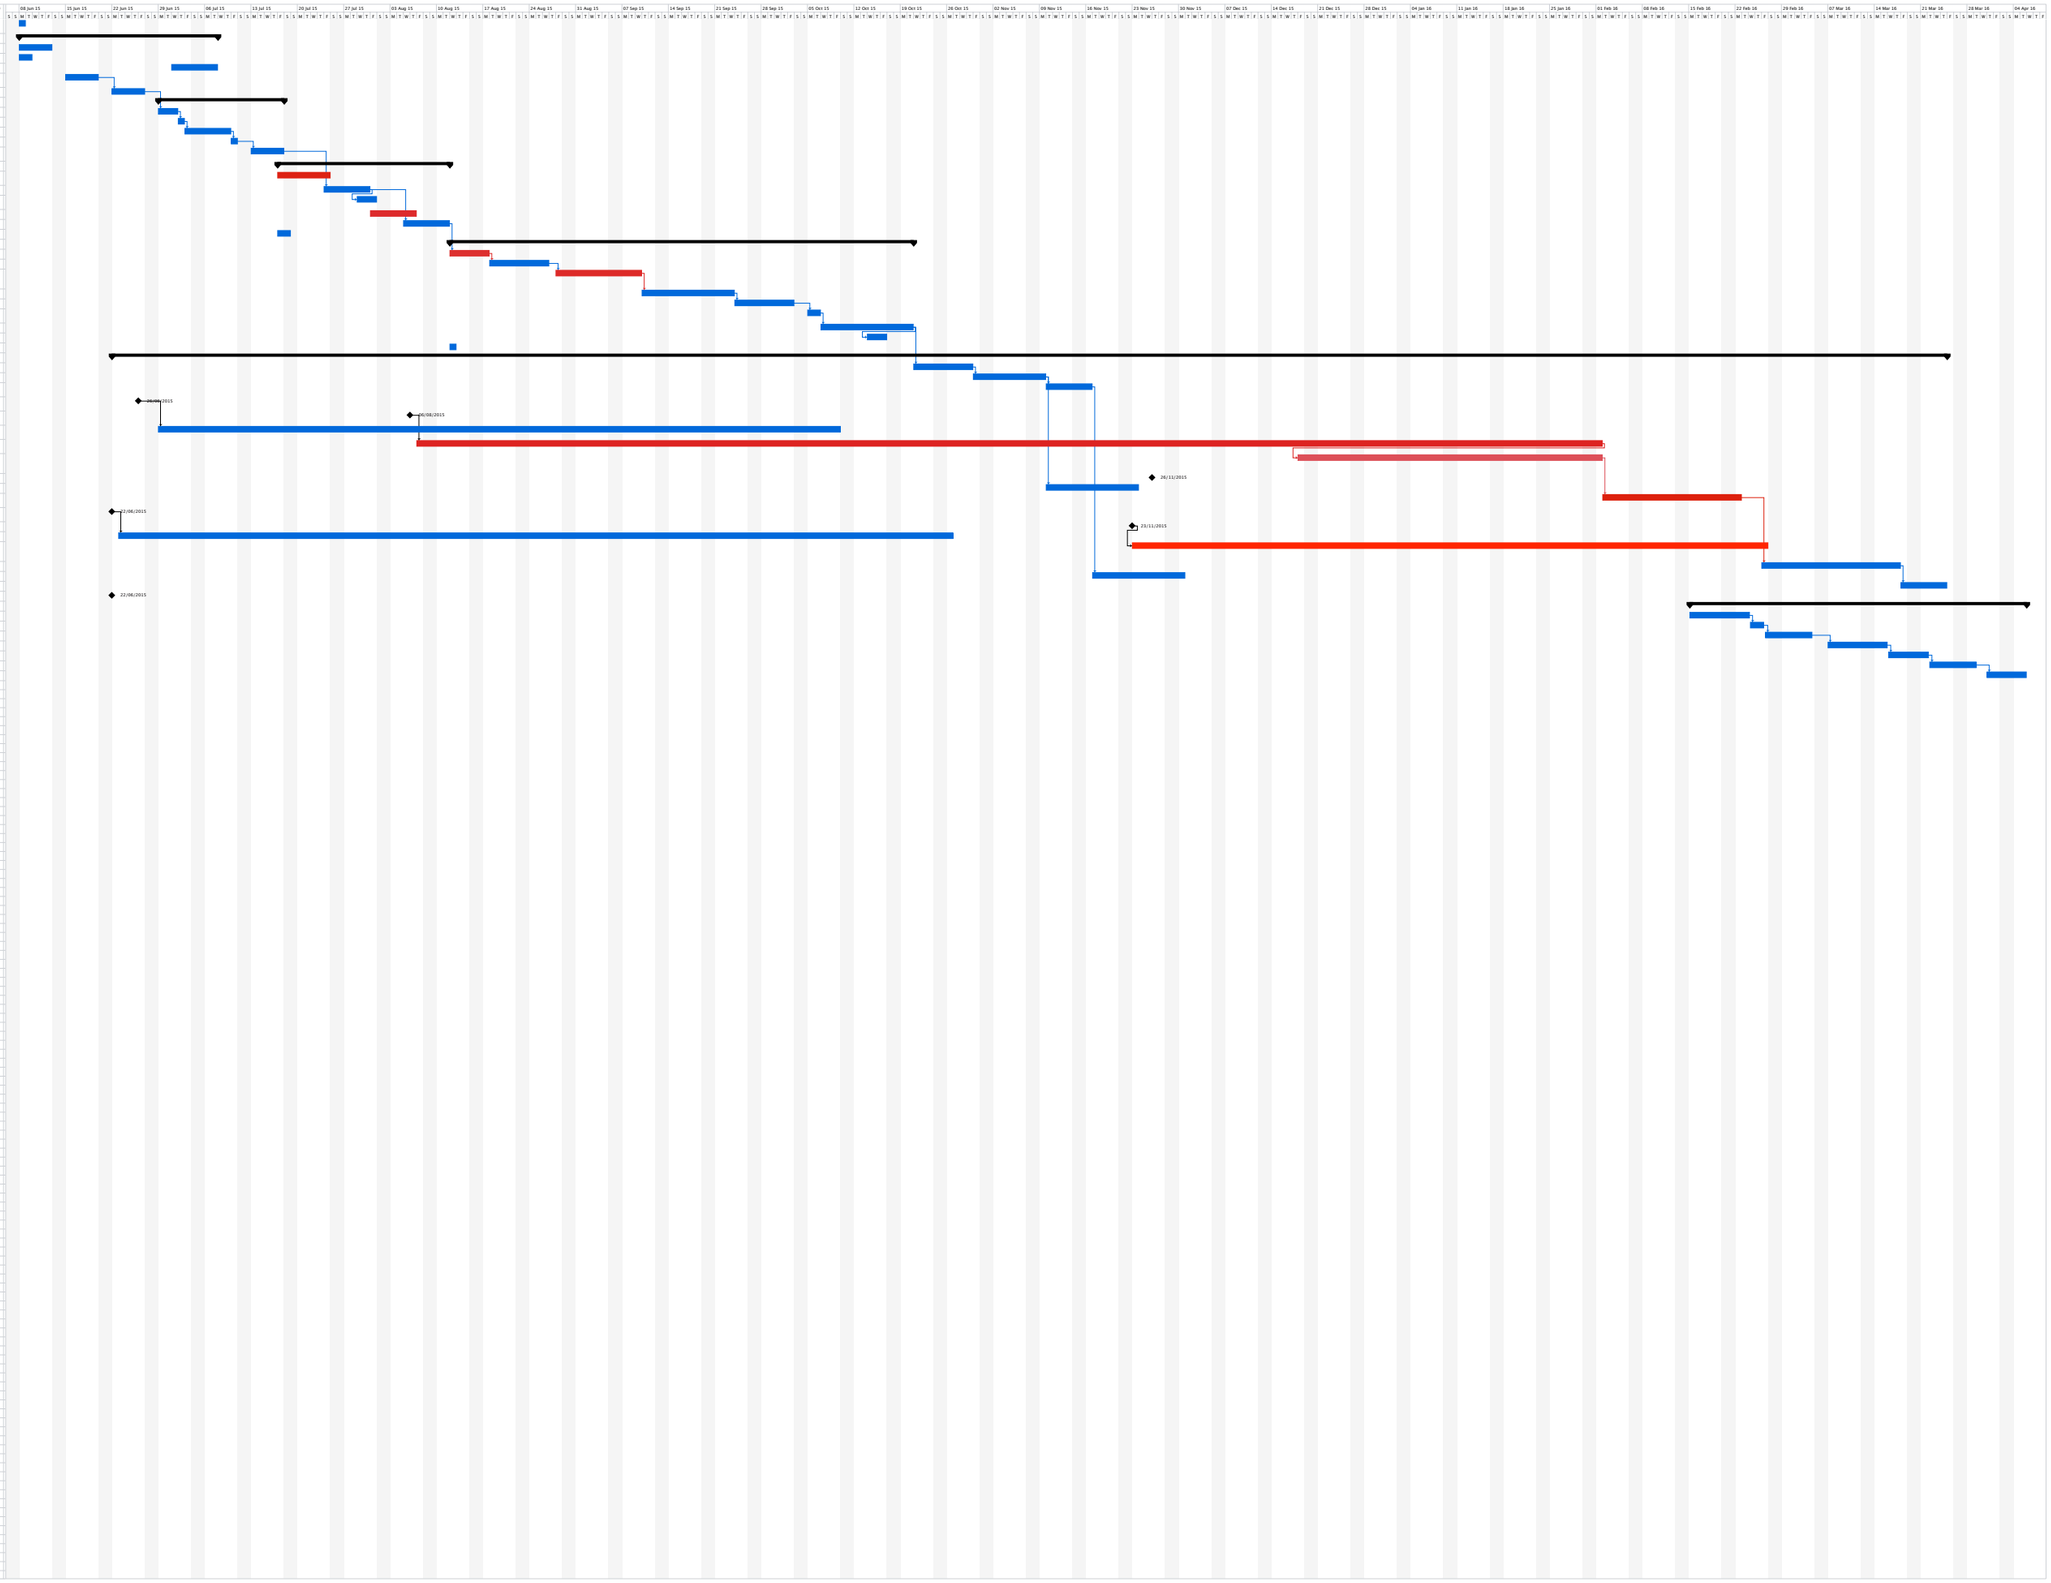Info	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	GLH – RESTAURANT SHELL & CORE	1 d	08/06/2015	08/06/2015		
2	**Enabling works**	**22 d**	**08/06/2015**	**07/07/2015**		
3	Site set up	1 d	08/06/2015	12/06/2015		
4	Clear rubbish & vegetation	2 d	08/06/2015	09/06/2015		
5	Repair & paint hoardings	5 d	01/07/2015	07/07/2015		
6	Break up & clear hardstandings	5 d	15/06/2015	19/06/2015		
7	Reduce level dig & cart	5 d	22/06/2015	26/06/2015	6	
8	**Piling**	**15 d**	**29/06/2015**	**17/07/2015**		
9	Form piling mat	3 d	29/06/2015	01/07/2015	7	
10	Setting out piles	1 d	02/07/2015	02/07/2015	9	
11	Piling	5 d	03/07/2015	09/07/2015	10	
12	Pile test	1 d	10/07/2015	10/07/2015	11	
13	Break down piles & pile caps	5 d	13/07/2015	17/07/2015	12	
14	**Groundworks**	**18 d**	**17/07/2015**	**11/08/2015**		
15	Underground ducts (variation)	6 d	17/07/2015	24/07/2015		
16	Drainage works	5 d	24/07/2015	30/07/2015	13FS+4 d	
17	Incoming services & ductwork	3 d	29/07/2015	31/07/2015	16FS-1 d	
18	Cruymaster (variation)	5 d	31/07/2015	06/08/2015		
19	Form groundfloor slab	5 d	05/08/2015	11/08/2015	16FS+3 d	
20		1 d	17/07/2015	18/07/2015		
21	**Concrete Frame**	**50 d**	**12/08/2015**	**29/10/2015**		
22	GF Column delayed start	4 d	12/08/2015	17/08/2015	19	
23	Ground-floor columns	7 d	18/08/2015	26/08/2015	22	
24	GF Column delayed completion (Brickwork wall demolished)	9 d	28/08/2015	09/09/2015	23	
25	First floor slab	10 d	10/09/2015	23/09/2015	24	
26	First floor columns	7 d	24/09/2015	02/10/2015	25	
27	FF Columns delayed completion	2 d	05/10/2015	06/10/2015	26	
28	Roof slab	10 d	07/10/2015	20/10/2015	27	
29	Stairs	3 d	14/10/2015	16/10/2015	28FS-5 d	
30		1 d	12/08/2015	12/08/2015		
31	**Cladding**	**199 d**	**22/06/2015**	**24/03/2016**		
32	Brickwork GF	7 d	21/10/2015	29/10/2015	28	
33	Brickwork 1st flr	7 d	30/10/2015	09/11/2015	32	
34	Brickwork/coppings to roof	5 d	10/11/2015	16/11/2015	33	
35	Place order for windows/ doors	0 d	26/06/2015	26/06/2015		
36	REVISED ORDER DATE FOR WINDOWS	0 d	06/08/2015	06/08/2015		
37	Lead time for windows/ doors	15 w	29/06/2015	06/10/2015	35	
38	REVISED LEAD TIME FOR WINDOWS	21.4 w	07/08/2015	01/02/2016	36	
39	ADDITIONAL DESIGN & LEAD TIME FOR TERRACE WINDOWS	52 d	18/12/2015	01/02/2016	38	
40	WINDOW SIGN OFF	0 d	26/11/2015	26/11/2015		
41	Windows & doors	10 d	10/11/2015	23/11/2015	33	
42	REVISED WINDOW INSTALLATION	15 d	02/02/2016	22/02/2016	39	
43	Place order for stone cladding	0 d	22/06/2015	22/06/2015		
44	STONE SIGN OFF	0 d	23/11/2015	23/11/2015		
45	Lead time for stone	18 w	23/06/2015	26/10/2015	43	
46	REVISED LEAD TIME FOR STONE FOLLOWING SIGN OFF	14 w	23/11/2015	26/02/2016	44	
47	Stone cladding	15 d	26/02/2016	17/03/2016	42	
48	Roof coverings	10 d	17/11/2015	30/11/2015	34	
49	Strike/Clean/Mastic	5 d	18/03/2016	24/03/2016	47	
50	Handover to tenant	0 d	22/06/2015	22/06/2015		
51	**Externals**	**36.78 d**	**15/02/2016**	**05/04/2016**		
52	Cast concrete slab	7 d	15/02/2016	24/02/2016		
53	Remove hoardings	2 d	24/02/2016	26/02/2016	52	
54	Foundations for walls	5 d	26/02/2016	04/03/2016	53	
55	Build walls/form ramps	7 d	07/03/2016	15/03/2016	54	
56	Install railings	4 d	16/03/2016	22/03/2016	55	
57	Install paving	5 d	22/03/2016	29/03/2016	56	
58	Soft landscaping	4 d	31/03/2016	05/04/2016	57
